

2-22

쾌적한 도시환경을 위한 하수처리구역 확대

사업주체	연천군	임기구분	임기 내	사업유형	계속	전체 이행률	29%
추진상황	정상추진			예산구분	예산	총 예산액	73,663 백만원

1 정책 목표


- 하수처리구역의 단계적 확대로 공공위생향상과 공공수역의 물환경 보전을 도모하여 쾌적한 도시환경 조성

2 사업 개요

- 사업위치: 연천군 일원
- 사업기간: 2022. 01. ~ 2026. 12.(5년)
- 사업규모: 하수처리구역 확대를 통한 하수관로 신설 L=52.16km
- 사업비: 73,663백만원

3 추진 계획

- 1단계(2024년 완료), 2단계(2025년 완료), 3단계(2026년 완료)로 단계별 추진

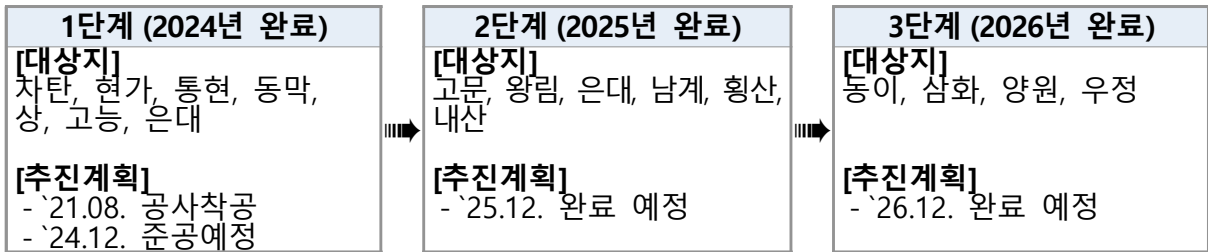

[연차별 추진목표]

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
대상지	17개 지역	-	-	차탄현가, 통현, 동막, 상, 고능, 은대	고문, 왕림, 은대, 남계, 횡산, 내산	동이, 삼화, 양원, 우정	-

[연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내						임기후 (d)
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	73,663	3,571	70,092	3,823	12,180	6,949	34,335	12,805	0
국비	46,168	2,500	43,668	3,245	7,619	5,063	20,060	7,681	
도비	3,833	-	3,833	-	79	218	2,482	1,054	
군비	23,179	1,071	22,108	578	4,482	1,668	11,310	4,070	
기타	483	-	483	-	-	-	483	-	-

※ 기타 : 자부담, 민자 등

4

추진실적

(2023. 12. 31. 기준)

[연차별 추진실적]

구분	2023년 추진목표	추진실적	이행률	비고
하수처리구역 확대	1단계 사업 공정률 60%	공정률 74%	123%	
	2단계 사업 공정률 30%	공정률 12%	40%	

[추진실적 총괄]

구분	단위	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
하수처리구역확대 (1단계)	공정률 (%)	목표	100%	30%	60%	100%	-	-	74%
		실적	74%	40%	74%	-	-	-	
하수처리구역확대 (2단계)	공정률 (%)	목표	100%	-	30%	60%	100%	-	12%
		실적	12%	-	12%	-	-	-	
하수처리구역확대 (3단계)	공정률 (%)	목표	100%	-	-	30%	60%	100%	-
		실적	-	-	-	-	-	-	
총 이행률									29%

[연차별 집행액]

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	22,265	12,728	4,636	4,636	12,180	8,092	5,449	0	0	0	0	0
국비	15,627	8,909	3,245	3,245	7,619	5,664	4,763	-	-	-	-	-
도비	197	52	-	-	79	52	118	-	-	-	-	-
군비	6,441	3,767	1,391	1,391	4,482	2,376	568	-	-	-	-	-
기타	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 기타 : 자부담, 민자 등

5

향 후 계 획

- '24. 03. 3단계사업 착공
- '24. 12. 1단계사업 완료
- '25. 12. 2단계사업 완료
- '26. 12. 3단계사업 완료

6

문제점 및 대책

- 한강유역환경청과 업무협의를 통해 하수처리구역 확대
 - 2023. 5. 18. “연천군 하수도정비기본계획(변경) 승인” 으로 주요 민원 지역인 남계리, 양원리, 횡산리, 우정리에 대한 하수처리구역 확대 근거 마련하였으나
 - 남계리 지역은 경제성 부족으로 지방비 투입 조건으로 승인
- 양원리, 횡산리, 우정리 지역은 2024년 환경부 국고보조사업으로 신청하였으나 환경부 신규사업 예산 부족으로 선정되지 않음

7

협 력 사 항

- 중앙부처(환경부/한강유역환경청)과의 협의 추진
 - 남계리 지역 하수처리구역 확대는 2024년 1회 추경에 군비 선투입하여 사업추진하고, 부족 예산은 특별조정교부금 등 국고지원 건의하여 확보된 예산 내에서 거주형태 하수발생량 등을 검토하여 단계적으로 사업 추진
 - 양원리, 횡산리, 우정리지역 하수처리구역 확대는 환경부와 우리군의 환경보전 필요성 등을 수시로 소통하여 2025년 국고보조사업으로 선정 될 수 있도록 지속 추진
